

KGM/16.142/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.142/K-HR
Tanımı	Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (Toprakarme hariç) (C30/37 hazır beton harcı ile) (Her ebat ve kalınlıkta)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	-41047,36	0,00	0,00
2025-Kasım	11343,15	0,00	0,00
2025-Ekim	11177,63	0,00	0,00
2025-Eylül	10916,09	0,00	0,00
2025-Ocak	9713,61	0,00	0,00
2024	7712,55	0,00	0,00
2023-2	4961,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3793,93	0,00	0,00
2022-3	2865,99	0,00	0,00
2022-2	2509,89	0,00	0,00
2022-1	1774,03	0,00	0,00
2021	986,15	0,00	0,00
2020	841,20	0,00	0,00
2019	728,56	0,00	0,00
2018	600,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.142/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

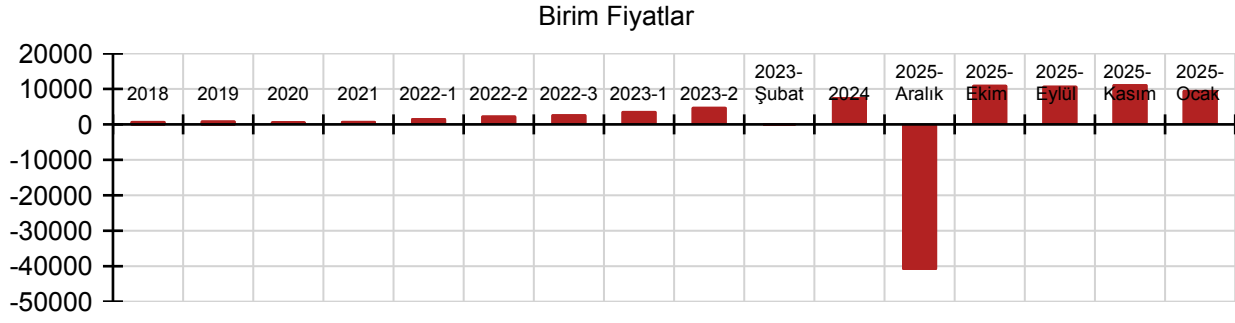

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.142/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/21.035/K-5		Prekast Elemanlar için 1 m ² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)	m ²	11,000000
KGM/1924		1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,240000
		Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, temizlenmesi, yağlanması ve kaldırılması karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Bölüm Toplamı		
		Plastik Şekil Levhaları, Kalıp için Özel Platform Yapılması Karşılığı : (BT*0,1)		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,060000
		Prekast cephe panellerinin yerlerine konulması karşılığı:		
KGM/16.140/K		Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması	m ³	1,000000
KGM/16.140/K		Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması	m ³	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
