

KGM/16.141/K-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.141/K-H
Tanımı	Toprakarme için Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11688,58	0,00	0,00
2025-Kasım	11514,45	0,00	0,00
2025-Ekim	11351,75	0,00	0,00
2025-Eylül	11080,78	0,00	0,00
2025-Ocak	9846,40	0,00	0,00
2024	7812,91	0,00	0,00
2023-2	5017,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3841,16	0,00	0,00
2022-3	2909,76	0,00	0,00
2022-2	2547,06	0,00	0,00
2022-1	1788,66	0,00	0,00
2021	1002,95	0,00	0,00
2020	864,49	0,00	0,00
2019	747,04	0,00	0,00
2018	617,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.141/K-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

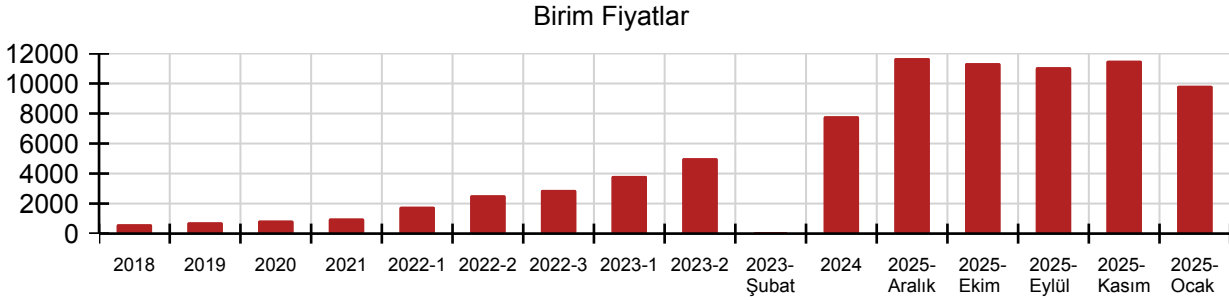

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, C 25/30 sınıfında hazır beton harcı ile toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerlerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Toprakarme için prekast cephe panellerinin imalinde; gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, kanca-takoz temini ve yerine konulması, ankraj halkaları ve pimin epoksi ile kaplanması, şekil verici malzemelerin temini ve kalıp içerisine yerleştirilmesi, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 25/30 sınıfında hazır betonun; iş başında temini, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, kuru, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb. nin sökülmesi, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin temini, nakli ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve yerlerine konulması, montaj için gerekli olan kaynak ve/veya her türlü malzeme ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği, toprakarme için prekast cephe panellerinin imal yerinden iş başına taşınması ile donatı şeritlerinin iş başında temini.

Ölçü:

Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.141/K-H'daki "Toprakarme İçin Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle) (Her ebat ve kalınlıkta)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/16.141/K-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/21.035/K-5		Prekast Elemanlar için 1 m ² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)	m ²	5,500000
KGM/1924		1 Saatlik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,240000
		Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, temizlenmesi, yağlanması ve kaldırılması karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Bölüm Toplamı		
		Platform teşkili, kanca-takoz temini ve yerine konulması, ankraj halkaları ve pimin epoksi ile kaplanması vs. her türlü ilave imalat karşılığı : (BT*0		
10.130.1505	04.042/05	C 25/30 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
		Prekast cephe panellerinin yerlerine konulması karşılığı:		
KGM/16.140/K		Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması	m ³	1,000000
KGM/16.140/K		Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması	m ³	0,300000
