

## 74.077.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.077.0003</b>	<b>(20.022/1c)</b>
<b>Tanımı</b>	12"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4402,63	0,00	0,00
2024	3355,39	0,00	0,00
2023-2	2068,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1347,06	0,00	0,00
2022-3	959,43	0,00	0,00
2022-2	775,85	0,00	0,00
2022-1	686,91	0,00	0,00
2021	434,33	0,00	0,00
2020	362,85	0,00	0,00
2019	309,26	0,00	0,00
2018	248,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

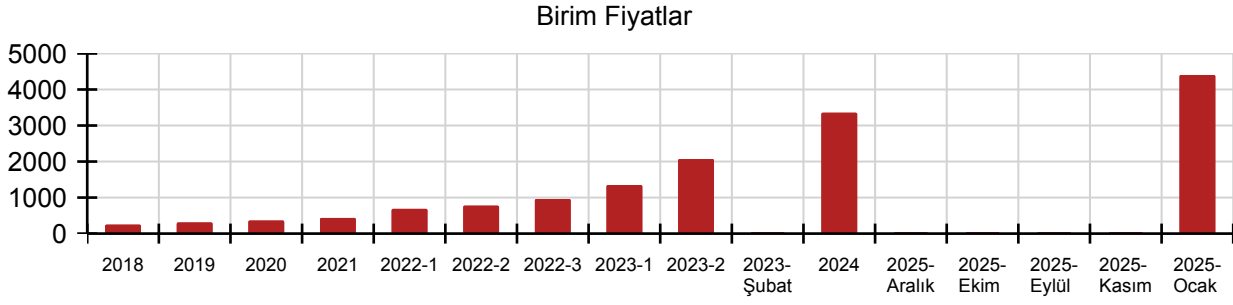

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	2,150000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	37,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,150000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	2,150000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,150000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	2,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,290000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
